



INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ		
CONSECUTIVO	RCO-2026-00017	ORDEN DE TRABAJO	OT-EC-ING-2026-014-0001
PERIODO	Desde 24/08/2026 hasta 28/08/2026		
TIPO REPORTE	AVANCE DE OBRA	ESTADO	CERRADO
RESPONSABLE			

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJE.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
24/08/2026	Localizacion y replanteo	UND	1,00	1,00	0,00	200,00%	EJECUTADA	AREAS DE TRABAJO	Ubicación de Torniquete en acceso al puerto definido por la supervisión de protección
26/08/2026	Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita.	M	576,00	150,00	414,00	28,13%	PARCIAL	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación/tendido de cableado eléctrico encauchetado 3x14 AWG	M	160,00	87,00	63,00	60,63%	PARCIAL	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación/tendido de cable UTP Cat 6 por canalización o ruta definida	M	766,00	171,00	245,00	68,02%	PARCIAL	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación de controladora RBH UNC-100	UND	3,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación de accesorios menores	UND	1,00	1,00	0,00	200,00%	EJECUTADA	AREAS DE TRABAJO	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-065 - TUBO PVC SCH40 3/4" x METRO	M	150,00	
COM-029 - CABLE UTP CAT 6 TIPO EXT (DS-1LN6OUSPE)	M	171,00	
ELE-031 - CABLE ENCAUCEHTADO 3x14AWG HF-FR-LS	M	87,00	
CON-009 - GRAPA CHANEL 3/4"	UND	50,00	
CON-069 - CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	30,00	
CON-067 - CURVA PVC SCH40 3/4"	UND	10,00	
CON-068 - ADAPTADOR PVC SCH40 3/4"	UND	10,00	
CON-008 - RIEL CHANEL PERFORADO 2x4	M	1,20	
CON-095 - CHAZO 3/8 ANCLAJE CONCRETO	UND	12,00	
CON-098 - TUERCA 3/8	UND	24,00	



MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-096 - ARANDELA 3/8	UND	24,00	
CON-097 - VARILLA ROSCADA 3/8 x 1m	UND	6,00	
CON-092 - CAJA DE REG 30X30X10	UND	1,00	
SEL-033 - CONTROLADORA (RBH-AX-UNC100-132S)	UND	1,00	
SEL-037 - TRANSFORMADOR 16.5V (UHF-AC1640)	UND	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ACTIVIDAD	FOTO
Localizacion y replanteo Definicion de ruta para tuberia y cableado desde cuarto tecnico hasta Torniquete acceso al puerto	

ACTIVIDAD	FOTO
Localizacion y replanteo Ubicación de Torniquete en acceso al puerto definido por la supervisión de protección	



ACTIVIDAD	FOTO
Localización y replanteo Obra civil para montaje de Torniquete	
Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. Montaje de Tubería en muro para cableado eléctrico y datos hacia Torniquete acceso al puerto	
Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. Montaje de Tubería en piso para cableado eléctrico y datos hacia Torniquete acceso al puerto	

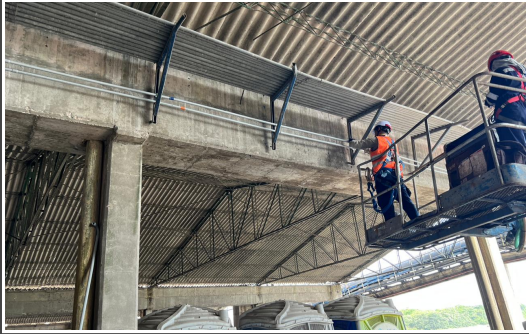

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. Montaje de Tubería para cableado eléctrico y datos hacia Torniquete acceso al puerto	
Instalación/tendido de cableado eléctrico encauchetado 3x14 AWG Instalación de cableado eléctrico hacia Torniquete acceso al puerto	
Instalación/tendido de cable UTP Cat 6 por canalización o ruta definida Instalación de cableado de datos hacia Torniquete acceso al puerto	



ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de controladora RBH UNC-100 Montaje Controladora de Acceso	

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de controladora RBH UNC-100 Montaje Controladora de Acceso y Caja para fuentes de voltaje	

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

**REGISTRO DE OBSERVACIONES**

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
CARLOS ARTURO CHICA MULET	TECNICO DE MONTAJE
DANIEL JOSE ARROYO ROMERO	AUXILIAR DE MONTAJE
STEFANY DE HOYOS NAVARRO	TECNICO SST-HSEQ

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
