



INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO		
CONSECUTIVO	RCO-2026-00006	ORDEN DE TRABAJO	OT-EC-ING-26-010-0003
PERIODO	Desde 30/07/2026 hasta 31/07/2026		
TIPO REPORTE	AVANCE DE OBRA	ESTADO	CERRADO
RESPONSABLE	JOSE AGAMEZ ESCUDERO - TEC ELECTRICISTA		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
30/07/2026	INSTALACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO.	UND	40,00	1,00	39,00	2,50%	PARCIAL	GENERAL	
30/07/2026	INSTALACIÓN DE MICROINVERSOR SOLAR ON-GRID MONOFÁSICO CON POTENCIA NOMINAL DE SALIDA 800W	UND	40,00	1,00	39,00	2,50%	PARCIAL	GENERAL	
31/07/2026	INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIONES AC (TPAC) TABLERO DE PROTECCIONES DC (TPDC)	UND	40,00	1,00	39,00	2,50%	PARCIAL	GENERAL	

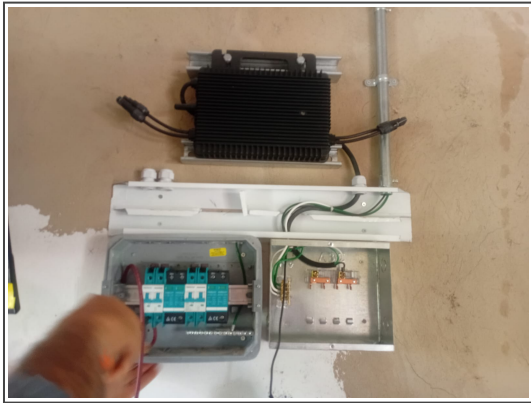
GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-048 - ADAPTADOR PVC CONDUIT 1"	UND	3,00	
CON-013 - ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	2,00	
FV-004 - BREAKER DC 2X20A 600V SUNTREEE	UND	2,00	
ELE-018 - BREAKER ENCHUFABLE AC 1x20A	UND	2,00	
ELE-025 - CABLE Cu 12AWG BLANCO	M	3,65	
ELE-024 - CABLE Cu 12AWG NEGRO	M	3,65	
ELE-023 - CABLE Cu 12AWG VERDE	M	0,60	
ELE-027 - CABLE ENCAUCEHTADO 3x12AWG	M	1,20	
FV-003 - CABLE SOLAR 6mm NEGRO	M	1,20	
FV-002 - CABLE SOLAR 6mm ROJO	M	1,20	
CON-051 - CAJA INSPECCION TIERRA 30x30 cm	UND	1,00	
CON-039 - CAJA RAWELT 4x4 2 SALIDAS 1" CON TAPA METALICA CON SELLO	UND	1,00	
CON-011 - CAJA RAWELT 5800 - SALIDAS 3/4" - 3 HUECOS	UND	1,00	
CON-073 - CANALETA METALICA 10x4 CON DIVISION x METRO	M	1,00	
CON-056 - CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO DRYWALL 8x1-1/2	UND	24,00	
CON-015 - CURVA EMT 3/4"	UND	3,00	



MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-017 - GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA	UND	4,00	
CON-054 - RIEL CHANEL LISO 4x4 X METRO	M	0,60	
ELE-019 - TABLERO SOBREPONER 12 CTOS TIPO RIEL CERTIFICADO	UND	1,00	
ELE-020 - TABLERO SOBREPONER 4 CTOS TIPO ENCHUFABLE CERTIFICADO	UND	1,00	
ELE-022 - TERMINAL DE OJO AMARILLO #12AWG	UND	1,00	
FV-007 - TERMINAL GRIS PIN HUECO #12AWG	UND	9,00	
CON-063 - TERMINAL NEGRO PIN HUECO #10AWG	UND	6,00	
CON-071 - TUBO EMT 3/4" x METRO	M	2,70	
CON-014 - UNION EMT 3/4"	UND	6,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
Registro general del reporte	

ACTIVIDAD	FOTO
Registro general del reporte	

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA**NOVEDAD EN OBRA**

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONESYARICETH CORONADO GUZMAN
EL SALADO**PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR****EMPLEADO****CARGO**

JOSE AGAMEZ ESCUDERO

TEC ELECTRICISTA

VALIDACIÓN DEL REPORTE**Elaboró / Responsable del reporte****Revisó / Coordinación****Recibió / Cliente o interventoría**

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:
